

## Verkeerde zonne-energie-installaties, gezien bij onze onafhankelijke inspecties



**Panelen over elkaar gelegd met inferieur constructiemateriaal**




**Paneel in schaduw en over valbeveiligingslijn heen**




**Door combinatie van water en zonnepanelen te zware dakbelasting**



**Kabels loshangend, niet beschermd tegen insnijden**

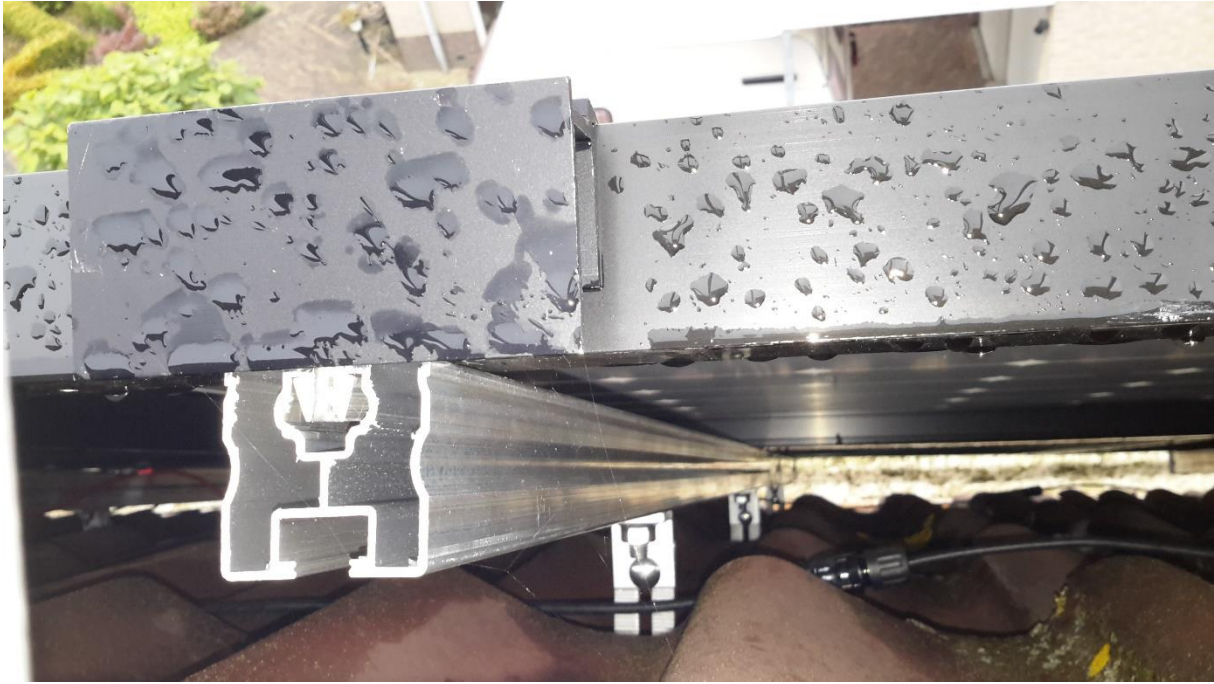

**Stekkers zitten los op de pannen (dit blijkt uit metingen)**

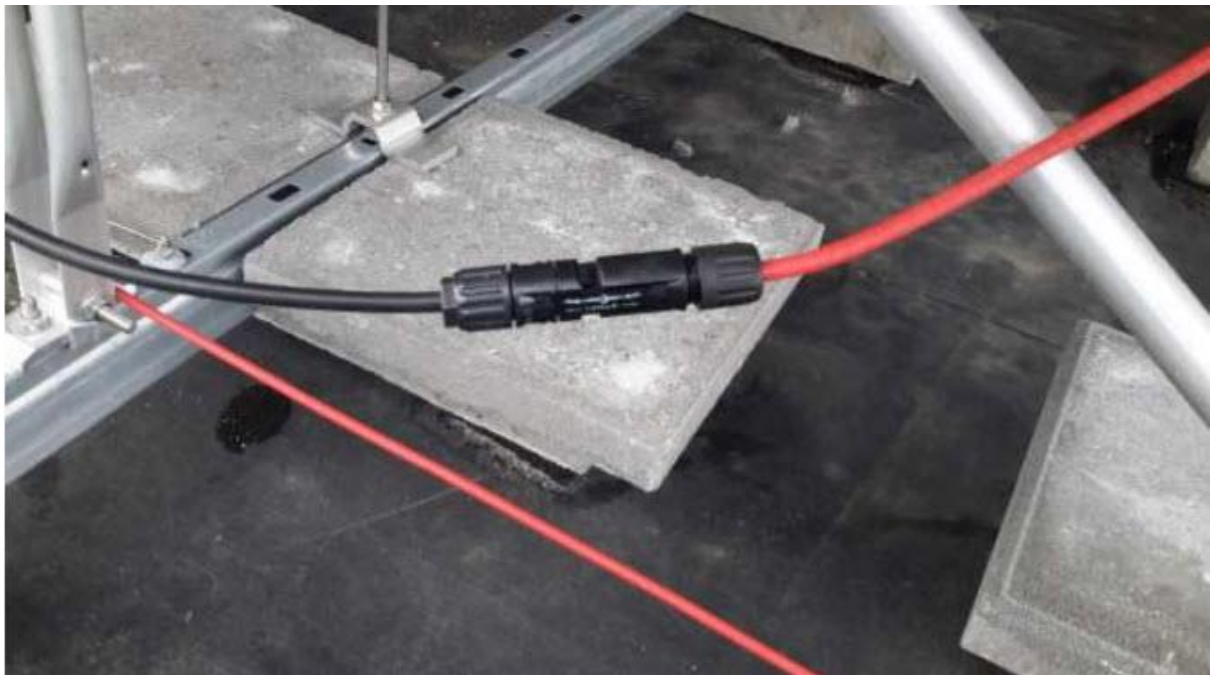

**Verschillende fabrikaten stekkers, mogelijk vonkend contact**



**Tiewraps niet bedoeld voor buiten**



**Paneel te strak tegen afvoer aan**


[www.zonnighuren.nl](http://www.zonnighuren.nl): onafhankelijk advies en opleveringscontroles voor pv-systemen



**Kabels tussen constructie door, kans op insnijden**



**Zonnestroomverdeler zonder hoofdschakelaar**

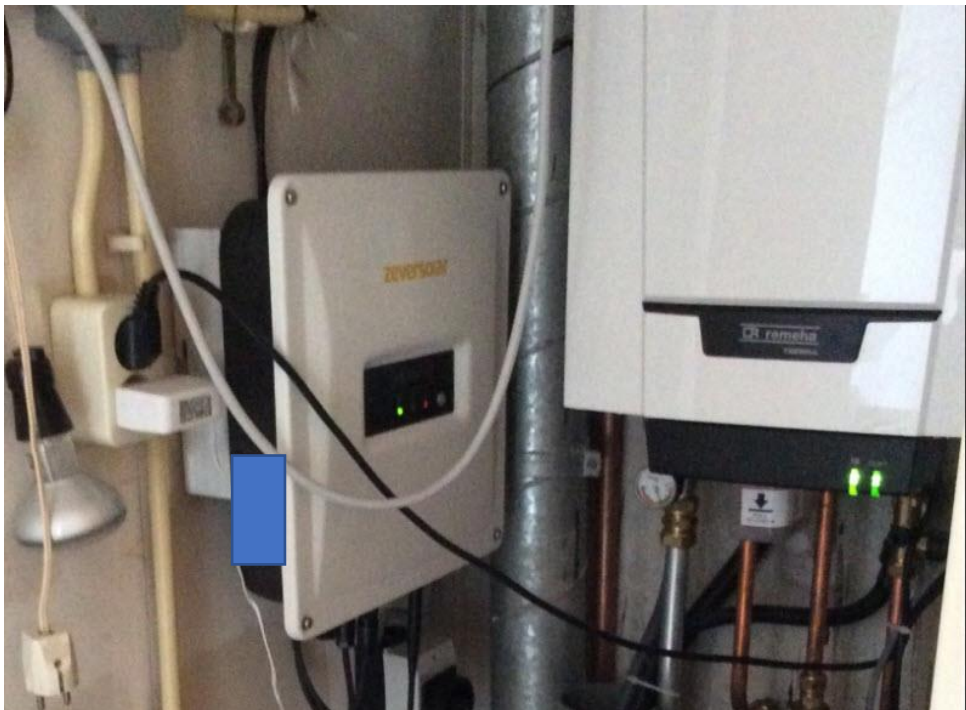

**Omvormers te dicht tegen muur aan ; kunnen warmte niet goed kwijt**



**Kabels vast aan warm waterleiding. Afvoer geraakt dus bij douchen loopt water in de meterkast.**
